

# Projet Constitution

## Panel

13/05/2019

Chef de Pôle : L.Borsellini



# 4. Déroulement chantier préparatoire

Tranchées communes pose de gaines  
Tirage de câble haute tension

Réalisation des  
oreilles 15/05-15/06

Fin 24/05

Fin 30/06

Aménagement  
voirie 23/05-30/06

Construction cabine HT  
20/05 – 31/08

Construction  
06/05 – Reporté  
05/06-19/07

Construction  
07-08-2019  
Avancé  
05/06-19/07


Avant le 15/07/2019



# 4. Déroulement chantier préparatoire

## Cabine haute tension – Stalingrad 128

- Déplacement de câbles en trottoir et dans la zone de stationnement et dépose de l'auvent 20/05/2019–24/05/2019
- Travaux de construction de la cabine 27/05/2019-30/08/2019  
(interruption des travaux du 14/07/2019 – 21/08/2019 avec emprise réduite compatible Foire du Midi)

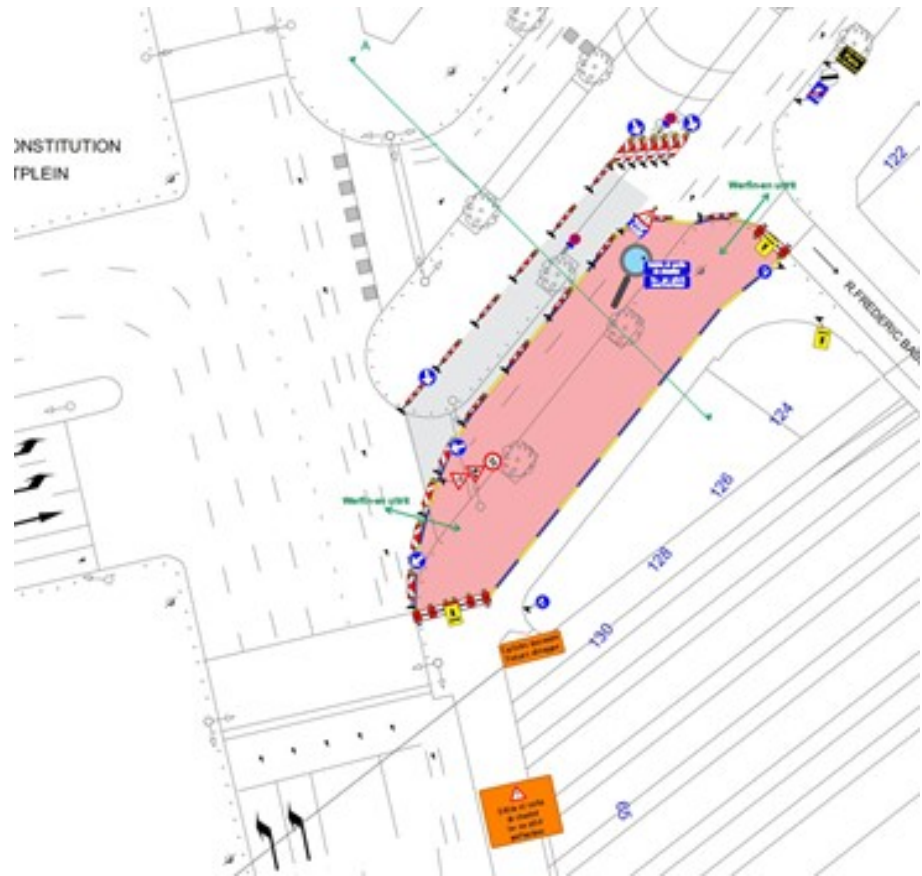


# 4. Déroulement chantier préparatoire

## Déplacement de l'égout Stalingrad 74-94

Transplantation de 4 arbres :  
20/05/2019-21/05/2019 :

Déplacement de l'égout en trottoir :  
07/06/2019-12/07/2019 :

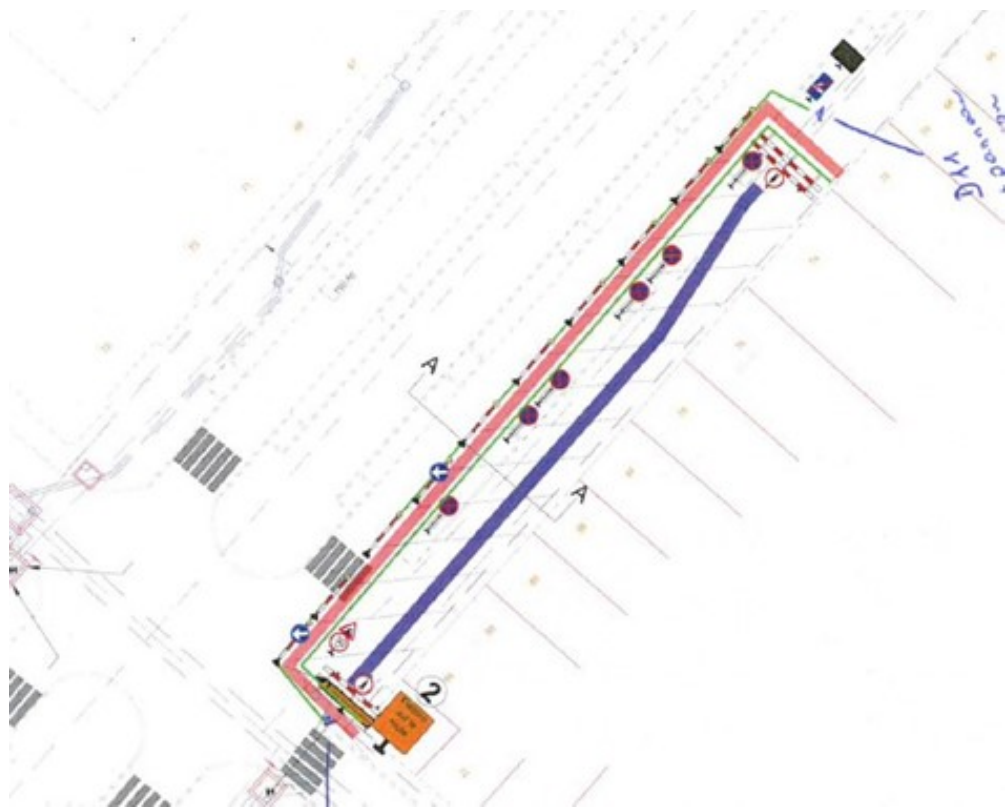


# 4. Déroulement chantier préparatoire

## Déplacement de l'égout Stalingrad 74-94

Déplacement temporaire de la terrasse du restaurant l'Océan et installation d'un point de vente Marrakech sur la berme centrale

### COUPE - DOORSNEDE A-A

SITUATION PENDANT LES TRAVAUX  
SITUATIE TIJDENS DE WERKEN

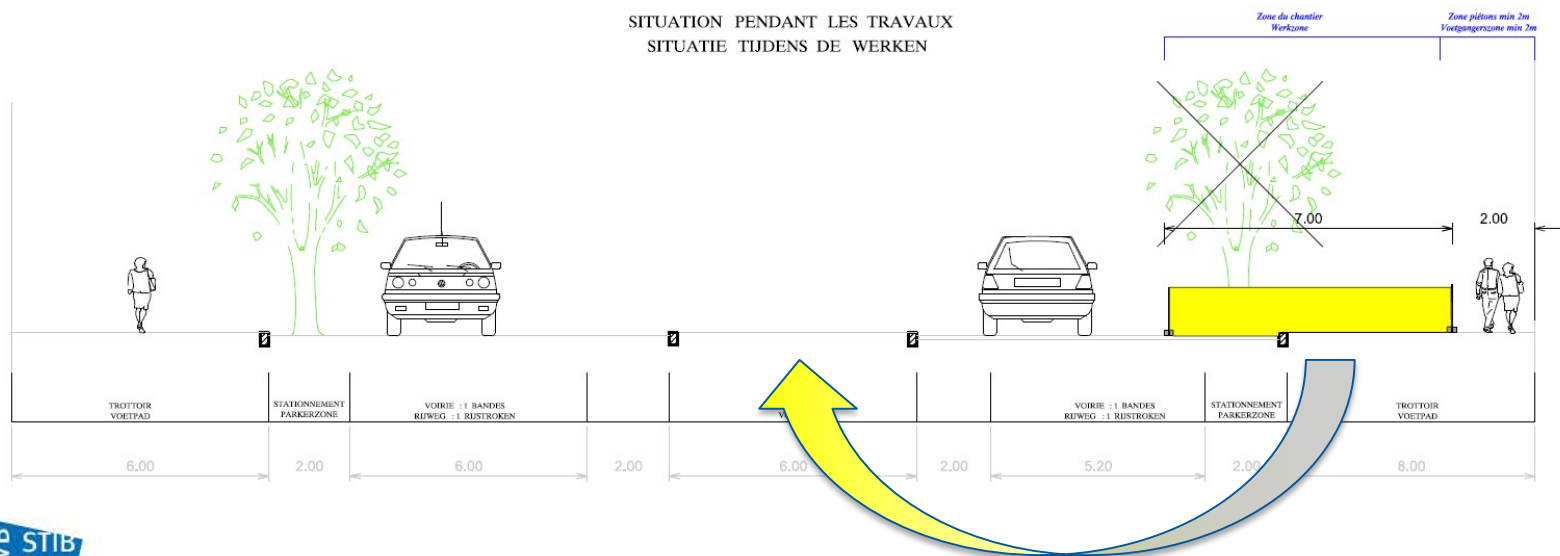

# 4. Déroulement chantier préparatoire

Pose câble  
21/08-30/08

Tranchées pose gaines  
et câbles 15/07-14/08

Pose  
télécoms  
08/07-12/07

Pose câbles  
21/08-30/08

Pose câbles  
et conduites  
02/09-30/09

Construction cabine  
HT → 31/08

Entre le 01/07/2019 et 30/09/2019
