


DÉPLACEMENT DE RÉSEAUX SOUTERRAINS & DÉMOLITION DU BÂTIMENT INFRABEL

TRAVAUX POUR LE FUTUR MÉTRO 3

Pour la construction de la nouvelle ligne 3 du métro, des travaux sont nécessaires pour mettre en place une zone de chantier: des travaux de déplacement de câbles et la démolition d'un bâtiment appartenant à Infrabel. Les travaux se déroulent en 5 phases, de janvier à mai 2020*.

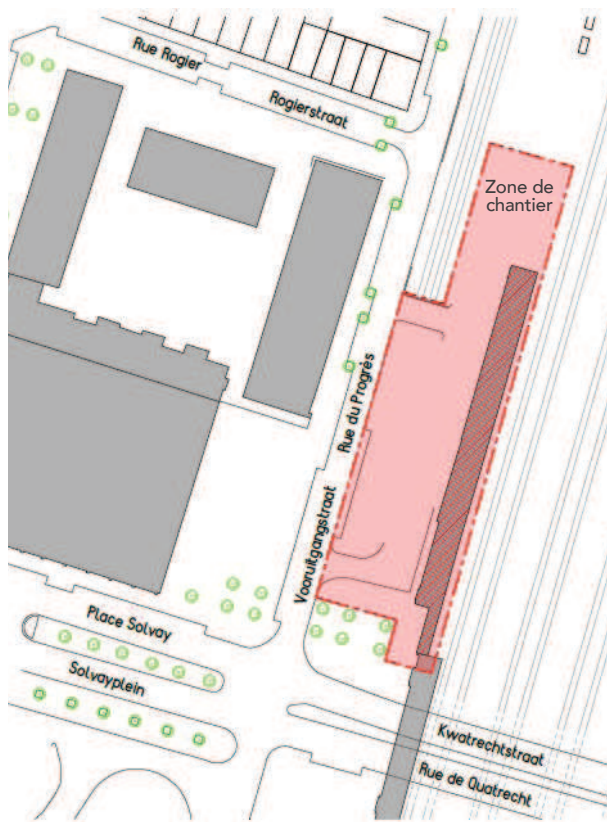

- 1 Travaux préparatoires Telenet - à partir du 20/01/2020**
Travaux préparatoires pour le déplacement des câblages réseaux. Telenet réalise ces travaux en une seule phase.
- 2 Préparation du chantier de démolition - janvier 2020**
Installation du chantier et délimitation de la zone.
- 3 Démantèlement et désamiantage - mi-février jusqu'à la mi-mars 2020**
Démontage et retrait d'éléments et équipements du bâtiment, protection du bâtiment et retrait de l'amiante.
- 4 Démolition - mars à avril 2020**
Démolition douce et contrôlée du bâtiment.
- 5 Achèvement du chantier - mai 2020**
Départ des derniers gravats et remblayage de la zone de chantier.

Les entrepreneurs prendront les mesures nécessaires pour diminuer l'impact des travaux. Les bureaux et maisons restent accessibles durant tout le chantier. Des déviations piétons, clairement indiquées, sont mise en place autour de la zone. Certaines places de stationnement sont supprimées. La circulation automobile reste inchangée.

Les ouvriers travaillent entre 7h - 19h.

Après les travaux, la zone de chantier délimitée sur le plan en annexe reste fermée.

PLUS D'INFORMATIONS

📞 0800 11 299 | 📧 info@metro3.be | 🌐 www.metro3.be

* Le planning est annoncé sous réserve d'intempéries ou d'éventuels travaux complémentaires.

Retrouvez les informations les plus récentes sur www.metro3.be
